

# PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE BILBAO

Informe ejecutivo

28 de julio 2016


Gestión del Plan de Aislamiento Acústico						
Declaración de Impacto Ambiental 25/05/09						
PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Derio	Erandio	Loiu	Sondika	Zamudio	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.159	145	394	21	221	1.940
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.153	54	327	12	186	1.732
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.153	52	324	12	185	1.726
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.097	30	201	2	120	1.450
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.096	30	198	-	109	1.433
Total de viviendas con financiación aprobada	1.096	23	197	-	80	1.396
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	125	10	56	-	31	222
Total de viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	971	13	141	-	49	1.174

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico	
Declaración de Impacto Ambiental 25/05/09	
<p>En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:</p>	
R=	$\frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 1.396}{\text{Total solicitudes recibidas } 1.732}$
<div style="background-color: yellow; padding: 5px; border: 1px solid black; display: inline-block;"> <b>80,60 % DEL P.A.A. FINALIZADO</b> </div>	

### Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2009-2016)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 1.396

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 1.174

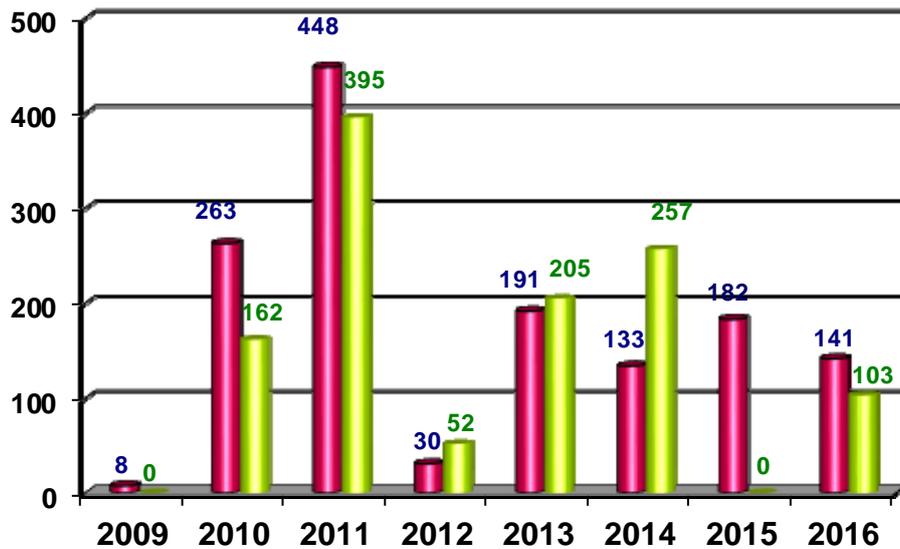

### Importe aprobados y pagos efectuados en Mill.€ (2009-2016)

TOTAL IMPORTES APROBADOS = 20,25 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS = 15,37 Mill. €

